


Nieuwsbrief Looiershof 12 juli 2017

Voortgang Project Looiershof

Beste mensen,

Gisterenochtend heeft er helaas een incident plaatsgevonden op de bouwplaats. Tijdens het vullen van de groene cementsilo's tussen 10 en 12 uur is er cement verloren gegaan. Dit cement is in de waterbak (paarse bak links van de groene cementcilo) terecht gekomen. Door Timmermans wordt water onttrokken aan de Jeker voor het aanmaken van het grout en voor het boorproces van de GEWI-palen. De waterbak wordt als buffer continu gevuld vanuit de Jeker, als er teveel water in komt stroomt het water via een overloop weer terug in de Jeker, zodat de bak niet kan overstromen. Er wordt in deze fase van het bouwproces géén water vanaf de bouwplaats geloosd.

Vanuit de overstortfunctie is het met cement vervuilde bufferwater in de Jeker terecht gekomen. Holcim, de leverancier van het cement, is er op gewezen dat hun handelswijze ongeoorloofd is.

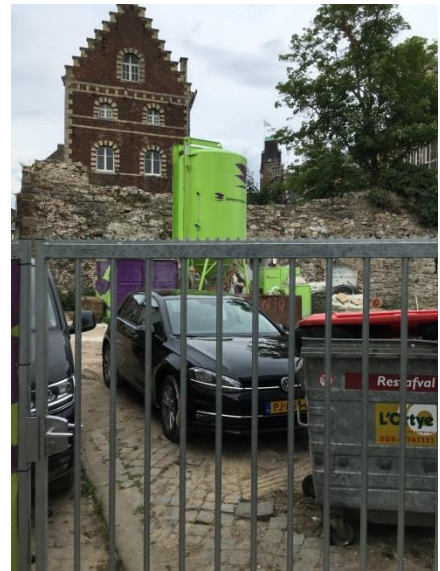

Het waterschap Limburg is gisteren rond 16.00 uur op de bouwplaats geweest en heeft de situatie aanschouwd. Het waterschap was niet blij met het voorval maar beschouwd dit als een eenmalig incident. Er zijn door het

Waterschap geen voorwaarden verbonden aan het incident. Na verloop van tijd spoelt de cement door natuurlijk verloop weg. De stroomsnelheid van de Jeker is zodanig dat de cement doorspoelt en niet verhardt. Cement is een natuurlijk product en in deze geringe hoeveelheid geeft het geen verontreiniging.

Vervolg van de werkzaamheden



Deze week worden de werkzaamheden aan de verticale GEWI-palen afgerond. Eén van de 2 boormachines is dinsdag 11 juli al afgevoerd. De 2^e machine zal naar verwachting aanstaande vrijdag worden afgevoerd. In totaal zijn er dan 125 horizontale ankers voor de verankering van de bouwkuip geboord en 292 verticale palen ten behoeve van de parkeergarage.

In het informatiebericht d.d. 7 juli 2017, is gemeld dat aanstaande maandag de torenkraan wordt opgebouwd. Nadat de kraan is opgebouwd wordt deze door een onafhankelijke instantie getest en gekeurd. Naar verwachting is woensdag 19 juli de torenkraan operationeel.

Bouwvakantie

Van 29 juli tot en met 20 augustus 2017 gaat de firma Timmermans met vakantie. Werkvoorbereider Stefan Vreuls zal incidenteel langskomen op de bouwplaats voor een controle/ inspectie. Indien u tijdens het reces iets afwijkends ziet kunt u dit altijd melden via melding@looiershof.com. Ook mag u rechtstreeks contact met hem opnemen via s.vreuls@timmermans-infratechniek.nl of op 06 5041 5062

Archeologie

Na 8 weken van onderzoek hebben de archeologen hun werkzaamheden binnen de bouwkuip van Looiershof gisteren afgerond. Bij de inrit aan de Looiersgracht zijn nog een vijftal skeletten gevonden. Zoals het er nu naar uitziet zijn eind deze week ook deze laatste menselijke resten verwijderd van de bouwplaats. Alle verzamelde onderzoeksmateriaal wordt dan afgevoerd naar een onderzoekslocatie.

Zoals uw wellicht afgelopen zaterdag in Dagblad de Limburger heeft gelezen http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170707_00043064/massagraf-met-tientallen-skeletten-ontdekt-in-maastricht, of afgelopen maandag op RTV Maastricht <http://www.rtvmaastricht.nl/tv/nieuws-en-actualiteiten/63545040> heeft gezien is er nog niet met 100% zekerheid te zeggen wat de achtergrond van deze mensen is.


Fysisch antropologen gaan dit nu nader onderzoeken. Zodra hier meer duidelijkheid over is stellen we u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Op de foto hiernaast is er ook nog de houten kist zichtbaar waarin de man of vrouw vroeger zonder kleding is begraven.



Planning:

Op dit moment volgen de werkzaamheden het schema van de contractplanning. Er was sprake van een voorsprong op de planning die als gevolg van het archeologisch onderzoek niet in stand kon blijven. Er is derhalve in de totale planning geen tijd verloren gegaan.

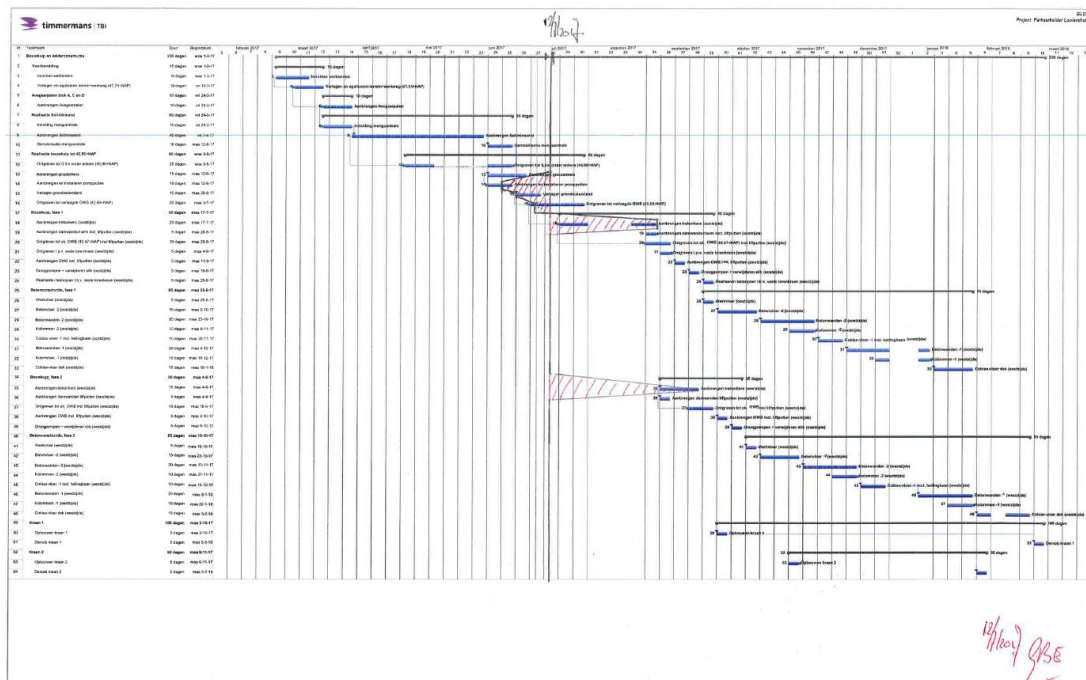

Werktijden

De werktijden zijn tussen 07.00u en 19.00u, binnen die uren vinden de bouwwerkzaamheden plaats. Incidenteel kan van de werkuren worden afgeweken, bijvoorbeeld het afleveren van materieel of betonstorten. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd met de betrokkenen/omwonenden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact met de omgeving

Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken via e-mail melding@looiershof.com en 24/7 via het **algemene nummer** voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

Projectleider van Timmermans, Gerard van den Berg. Hij is bereikbaar op het mobiele nummer **06 21 504615** en email g.vandenberg@timmermans-infra.nl .

Tijdens het zomerreces van 29 juli tot en met 20 augustus 2017 werkvoorbereider Stefan Vreuls s.vreuls@timmermans-infratechniek.nl of op **06 5041 5062**

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur van augustus komt vanwege het zomerreces te vervallen.

Het eerstvolgende inloopspreekuur is op donderdag 7 september tussen 17.00-19.00 uur.

U kunt daar terecht voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden Looiershof. U kunt zich melden bij de ingang Ezelmarkt/Looiersgracht.

Klankbordgroep

De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep moet nog worden ingepland.

De klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt ideeën uit met de aannemer. Wilt u ook meepraten? U kunt zich aanmelden via melding@looiershof.com

Nog vragen?

E-mail melding@looiershof.com

24/7 algemeen nummer voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

Projectleider Gerard van den Berg: 06 21 504615.



Of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:

Ilse Staals telefoonnummer 040 -233 39 25

ilse.staals@focusrealestate.eu

De volgende nieuwsbrief verschijnt vlak voor het zomerreces eind juli 2017.

Voor informatie kunt u ook terecht op de website www.looiershof.com

Eindhoven, 12 juli 2017

