

## Informatiebericht omwonenden Looiershof 9 september 2017

### **Informatie verstrekking met betrekking tot werkzaamheden buiten de, in de Vaststellingsovereenkomst Looiershof, overeengekomen werktijden.**


Beste mensen,

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat de werkzaamheden voor het maken van de tijdelijke bouwkuip en het grondwerk gereed zijn.

De volgende fase, het bouwen van de 2 laags parkeergarage in de bouwkuip, is begonnen.



De poeren voor de kolommen en lift/ pompputten zijn gereed. De vlechter van de wapening voor de vloer is begonnen. Nadat de wapening voor de vloer is verwerkt wordt de betonvloer in 2 delen gestort.

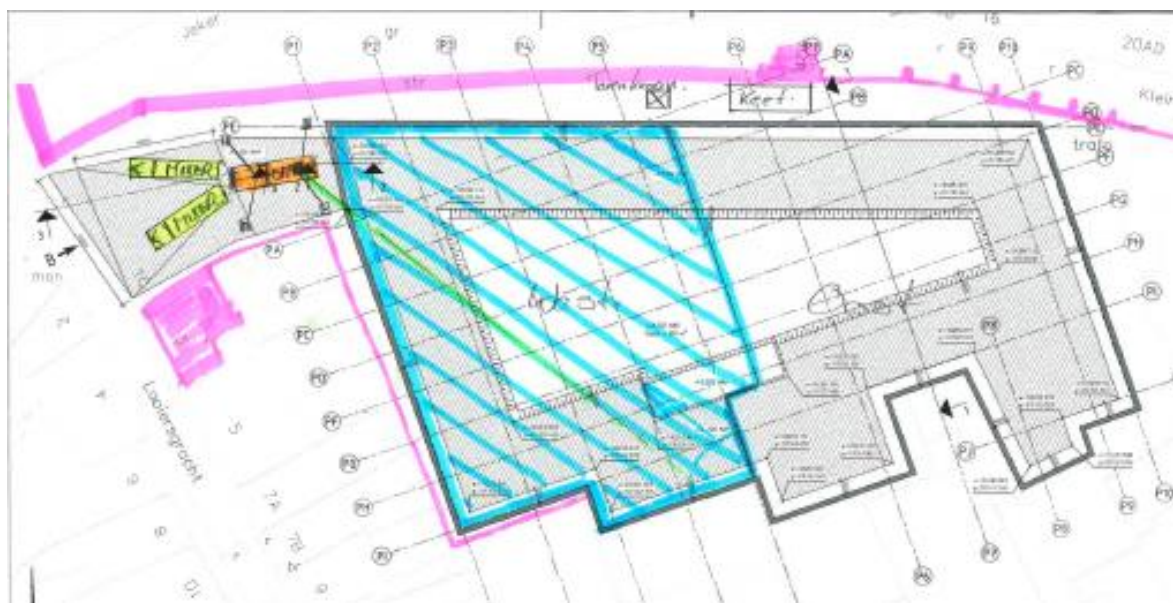

De betonstort voor het eerste westelijke gedeelte ca. 600 m<sup>3</sup> beton staat voor vrijdag 22 september 2017 gepland. Het proces voor de betonstort moet in één doorlopende handeling worden uitgevoerd. Door deze werkzaamheden op een vrijdag uit te voeren kan het uithardingsproces gedurende het weekend plaatsvinden waardoor er geen tijd verloren gaat in het bouwproces en in de totale planning.



Vanaf 7.00 uur 's morgen wordt de betonpomp bij de inrit van de bouwplaats aan de Ezelmarkt/Looiersgracht opgesteld en aansluitend wordt vanaf 7.30 uur de betonmortel aangevoerd. Dit gaat continu door tot ca. 16.00 uur.

Tijdens het betonstorten zal er enige overlast zijn t.g.v. betonpomp, aanrijden betonmixers en het met trilnaalden verdichten van betonmortel op de vloer.

De betonvloer moet glad (monolithisch) worden afgewerkt. Voor de afwerking worden vlindermachines ingezet (dit zijn grote blazers die het beton glad blazen) en deze zullen vanaf 14.00 uur aanvangen te blazen. Afhankelijk van verharding van het beton, wat mede afhankelijk is van de buitentemperatuur, zullen de vlindermachines tussen 22.00 en 24.00 uur gereed zijn.

Op zaterdag 23 september wordt vanaf ca. 8.00 uur de betonvloer afgedekt met oranje isolatiekleden ten behoeve van de nabehandeling en verdere uitharding en worden de vlindermachines afgevoerd.

Gaarne vragen wij uw begrip voor de geplande werkzaamheden.

De opvolgende betonstorten staan ingepland (uitvoering onder voorbehoud van de weersomstandigheden):

- Vloer-2 oost 13-10-2017
- Vloer -1 west 27-10-2017
- Vloer -1 oost 8-12-2017
- Vloer 0 west 22-12-2017
- Vloer 0-oost 23-3-2018

De geplande werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Bij regen en/ of vorst worden deze uitgesteld tot na het weekend. Over de definitieve data van uitvoering wordt u tijdig geïnformeerd. Ook als de werkzaamheden vanwege de weersomstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt u daarover direct geïnformeerd.

### **Contact met de omgeving**

Voor alles wat de bouwplaats en het bouwplan aangaat zijn de betrokken partijen te bereiken via e-mail [melding@looiershof.com](mailto:melding@looiershof.com) en 24/7 via het **algemene nummer** voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

### **Inloopspreekuur**

Het inloopspreekuur van afgelopen donderdag is door circa 20 mensen bezocht. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op **donderdag 5 oktober 2017** tussen 17.00-19.00 uur.

U kunt daar terecht voor een kop koffie en voor vragen of opmerkingen over de bouwwerkzaamheden Looiershof. U kunt zich melden bij de ingang Ezelmarkt/Looiersgracht.

### **Klankbordgroep**

De volgende bijeenkomst met de klankbordgroep moet nog worden ingepland. De klankbordgroep gaat in gesprek over de laatste ontwikkelingen en wisselt ideeën uit met de aannemer. Wilt u ook meepraten? U kunt zich aanmelden via [melding@looiershof.com](mailto:melding@looiershof.com)

**Nog vragen?**

**E-mail** [melding@looiershof.com](mailto:melding@looiershof.com)

**24/7 algemeen nummer** voor vragen en opmerkingen: **043-207 0407**

**Projectleider Gerard van den Berg: 06 21 504615.**

Of met betrekking tot de Vaststellingsovereenkomst Looiershof:

Ilse Staals telefoonnummer 040 -233 39 25

[ilse.staals@focusrealestate.eu](mailto:ilse.staals@focusrealestate.eu)

Voor informatie kunt u ook terecht op de website [www.looiershof.com](http://www.looiershof.com)

Eindhoven, 9 september 2017

